

REPUBLIKA HRVATSKA  
Nacionalni plan migracije  
na SEPA-u

Dodatak 1.

ožujak 2016.

## Sadržaj

Uvod – Nacionalni plan migracije na SEPA-u – Dodatak 1.....	3
Ustroj i vođenje projekta SEPA u Republici Hrvatskoj .....	4
Organizacija projekta SEPA u Republici Hrvatskoj.....	4
Odbor za upravljanje nacionalnim platnim shemama (OUNS).....	5
Plan migracije na SEPA-u.....	6
Plan testiranja .....	6
Plan migracije na SEPA-u, ožujak 2016.....	7

## **Uvod – Nacionalni plan migracije na SEPA-u – Dodatak 1.**

Nacionalnim planom migracije na SEPA-u (travanj 2014.), između ostalog, predviđeno je da se Plan migracije, u ovisnosti o planiranim aktivnostima i prihvaćenim promjenama na Nacionalnom odboru za platni promet, može dopuniti i izmijeniti.

Budući da su u međuvremenu nastupile određene promjene u organizacijskoj strukturi provođenja SEPA projekta u RH kao i da su predložene izmjene u ranije prihvaćenim datumima koji se odnose na početak primjene pojedinih aktivnosti iz plana migracije na SEPA-u, Nacionalni odbor za platni promet (NOPP) na svojim je sjednicama (24. sjednica održana je u svibnju 2015., a 26. sjednica u veljači 2016.) jednoglasno prihvatio njegove izmjene.

Slijedom prihvaćenih izmjena, izrađen je Nacionalni plan migracije na SEPA-u – Dodatak 1., u kojemu je sadržano sljedeće:

- izmjena organizacijske sheme projekta SEPA u Republici Hrvatskoj
  - osnovan je Odbor za upravljanje nacionalnim shemama (OUNS)
  - donesena je odluka o prestanku rada Hrvatskog odbora za SEPA koordinaciju (HOSK)
- određeni su novi datumi početka primjene Pravila HRK SCT sheme, Pravila Osnovne HRK SDD sheme i Pravila Poslovne HRK SDD sheme
- određen je novi datum početka rada EuroNKS-a.


## Ustroj i vođenje projekta SEPA u Republici Hrvatskoj

Prateći tijek razvoja projekta Hrvatski odbor za SEPA koordinaciju zaključio je da je nakon izrade nacionalnih shema za izvršenje platnih transakcija kreditnog transfera i izravnog terećenja, odnosno pravila HRK SCT sheme, Osnovne HRK SDD sheme i Poslovne HRK SDD sheme, potrebno osnovati posebno tijelo koje bi bilo zaduženo za upravljanje shemama.

Nacionalni odbor za platni promet na svojoj 24. sjednici održanoj 18. svibnja 2015. donio je odluku o osnivanju Odbora za upravljanje nacionalnim shemama (OUNS).

Osnivanjem OUNS-a prestala je potreba za radom Hrvatskog odbora za SEPA koordinaciju, te je OUNS preuzeo ulogu u daljnjem upravljanju nacionalnim SEPA shemama, kao i zadaću daljnjeg razvoja projekta SEPA u Republici Hrvatskoj.

### Organizacija projekta SEPA u Republici Hrvatskoj

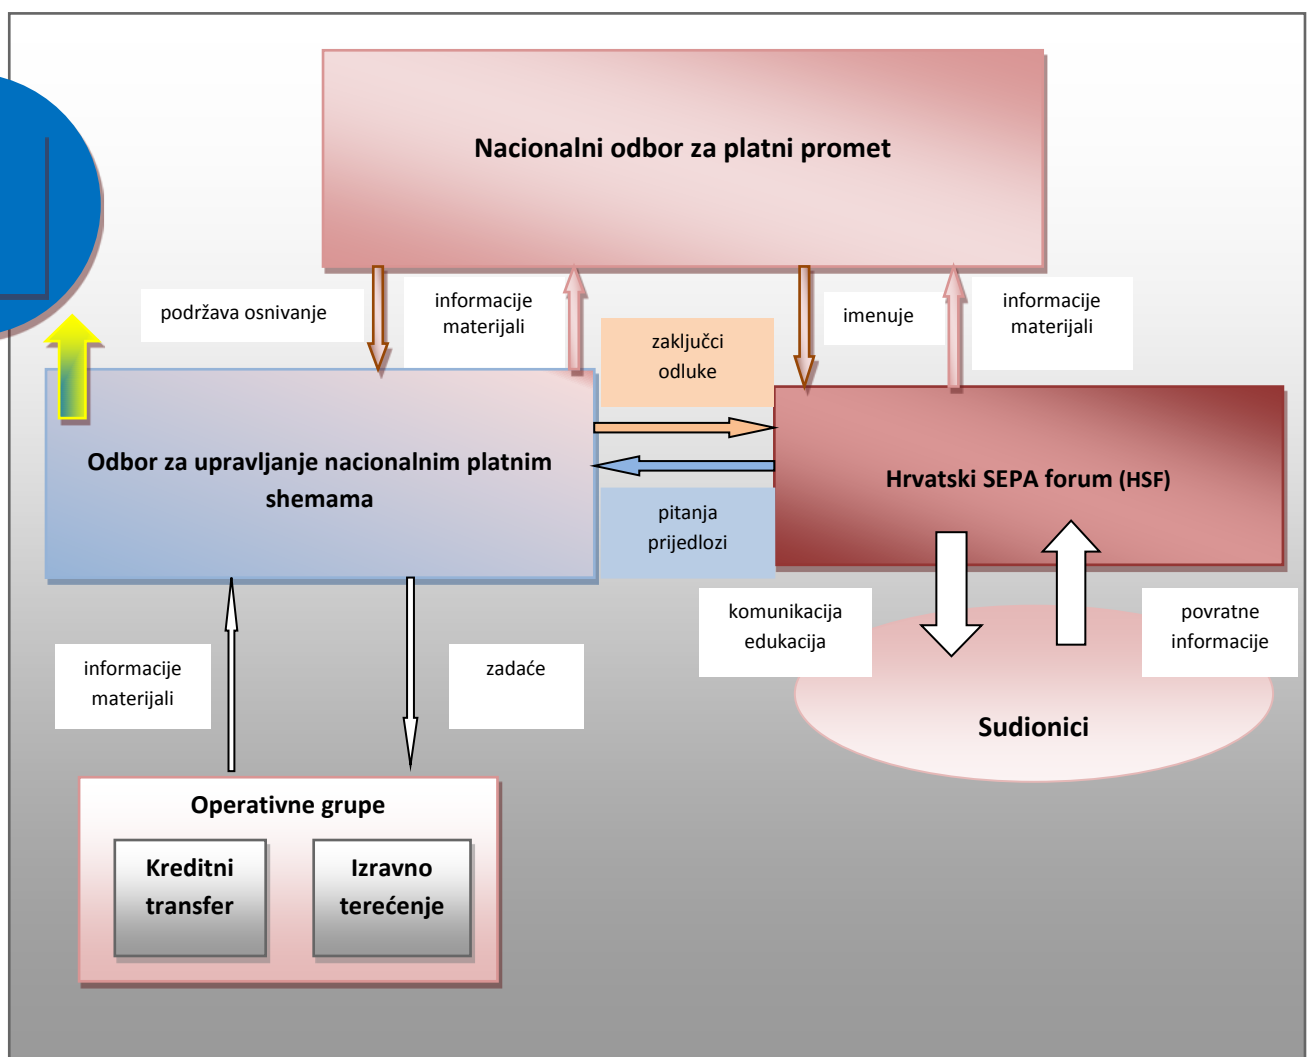

Nacionalni odbor za platni promet na svojoj 26. sjednici donio je Odluku o prestanku važenja Odluke o osnivanju Hrvatskog odbora za SEPA koordinaciju i podržan je prijedlog nove organizacijske sheme projekta SEPA u Republici Hrvatskoj.

### **Odbor za upravljanje nacionalnim platnim shemama (OUNS)**

Nacionalni odbor za platni promet na svojoj 24. sjednici podržao je prijedlog za osnivanje Odbora za upravljanje nacionalnim platnim shemama pri Hrvatskoj udruzi banaka, ali je također odlučeno da ravnopravno sudjelovanje, u svim pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva OUNS-a, mora biti osigurano svim sudionicima shema i ne smije biti uvjetovano članstvom u Hrvatskoj udruzi banaka.

Dana 8. srpnja 2015. održana je 1. konstituirajuća sjednica OUNS-a.

Poslovnik OUNS-a donesen je na 2. sjednici OUNS-a održanoj 21. prosinca 2015., a prihvaćen je na 26. sjednici Nacionalnog odbora za platni promet održanoj 24. veljače 2016. Osnovne uloge OUNS-a su:

- upravljanje HRK SCT shemom
- upravljanje Osnovnom HRK SDD shemom
- upravljanje Poslovnom HRK SDD shemom
- upravljanje izmjenama shema te dostavljanje svih izmjena i dopuna NOPP-u na prihvaćanje
- praćenje promjena SEPA-e i njihova implementacija
- osiguravanje da sudionici pojedine sheme poštuju pravila sheme
- izrada svih akata i dokumenata potrebnih za njegovo funkcioniranje
- suradnja s drugim nadležnim tijelima Europske unije i sudjelovanje u radu koordinacijskih odbora.

Članovi OUNS-a su predstavnici banaka koje su pristupile najmanje jednoj shemi, predstavnici Hrvatske narodne banke, Hrvatske banke za obnovu i razvitak te Financijske agencije.

U svrhu veće operativnosti i efikasnosti u radu, pri OUNS-u djeluju dvije operativne grupe: Operativna grupa za kreditni transfer i Operativna grupa za izravno terećenje.


## Plan migracije na SEPA-u

### Plan testiranja

Prihvaćenim izmjenama Nacionalnog plana migracije na SEPA-u na 26. sjednici Nacionalnog odbora za platni promet, a u svrhu osiguranja spremnosti svih sudionika na migraciju u skladu s definiranim datumima i daljnjega nesmetanog funkcioniranja platnog prometa, ujedno je prihvaćen i plan provođenja testiranja prema sljedećim datumima:

- Sudionici Nacionalnoga klirinškog sustava obvezuju se da će u potpunosti provesti i završiti sve testne aktivnosti prema testnim scenarijima Fine do 15. ožujka 2016.
- Podnositelji zahtjeva za sudjelovanje u EuroNKS-u obvezuju se da će u potpunosti provesti i završiti sve testne aktivnosti prema testnim scenarijima Fine do 15. ožujka 2016.
- Pružatelji platnih usluga obvezuju se sa svojim korisnicima platnih usluga provesti sva potrebna testiranja i pripreme radnje u svrhu ispunjenja zadanih rokova.
- Fina će dostaviti svim sudionicima Nacionalnoga klirinškog sustava i podnositeljima zahtjeva za sudjelovanje u EuroNKS-u scenarij "End-to-end" testa do 15. ožujka 2016.
- Fina se obvezuje osigurati provođenje "End-to-end" testa u trajanju od četiri tjedna nakon 15. ožujka 2016.
- Sudionici Nacionalnoga klirinškog sustava obvezuju se da će uspješno provesti "End-to-end" test prema testnom scenariju Fine u definiranom testnom razdoblju.
- Podnositelji zahtjeva za sudjelovanje u EuroNKS-u obvezuju se da će uspješno provesti "End-to-end" test prema testnom scenariju Fine u definiranom razdoblju.
- Fina će do 20. travnja 2016. izvijestiti Hrvatsku narodnu banku o rezultatima testiranja.

Nakon provedenih svih testnih aktivnosti i zaprimljenog izvješća Fine o uspješno završenim testiranjima Hrvatska narodna banka prihvatit će migraciju platnih instrumenata prema definiranim datumima iz Nacionalnog plana migracije na SEPA-u – Dodatka 1.

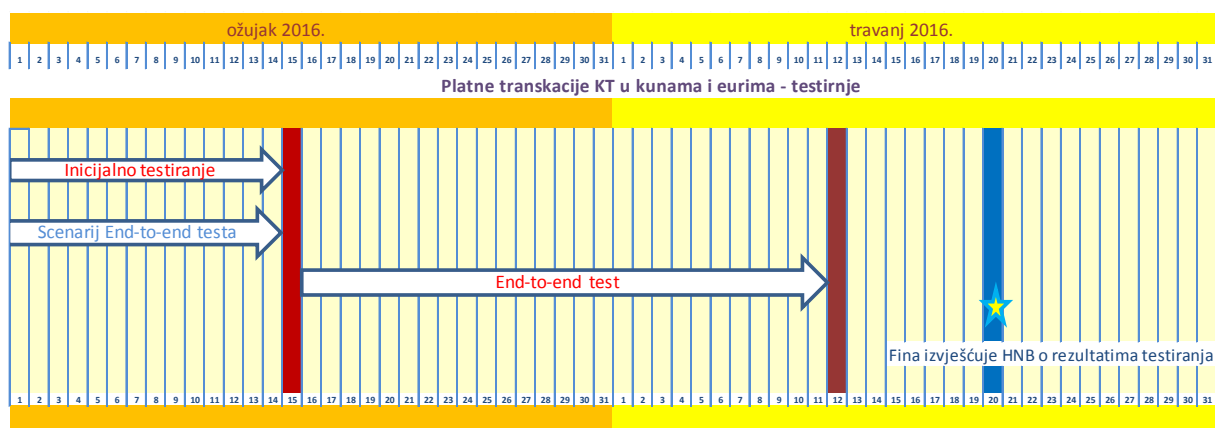

## Plan migracije na SEPA-u, ožujak 2016.

SEPA terminski plan ključnih aktivnosti				
Aktivnost	Podaktivnost		EURO	KUNA
IBAN			izvršeno	izvršeno
Infrastruktura	NKS	SCT	izvršeno	izvršeno
		SDD		1. 10. 2016.
	Target2		izvršeno	
SCT	NKS – nacionalne		6. 6. 2016.	6. 6. 2016.
	NKS – prekogranične		7. 6. 2016.	
	XML za korisnike		6. 6. 2016.	6. 6. 2016.
SDD	NKS – nacionalne			1. 2. 2017.
	NKS – prekogranične			
	XML za korisnike			1. 2. 2017.

### SEPA kreditni transfer u eurima

#### Nacionalne platne transakcije u eurima

EuroNKS platni sustav za obračun platnih transakcija SEPA kreditnog transfera u eurima dobio je odobrenje za rad. Spreman je za testni rad.

Hrvatska komponenta Target2 sustava – Target2-HR u produkcijskom je radu od **1. veljače 2016.**

Obračun nacionalnih platnih transakcija u eurima u Euro-NKS-u započet će s produkcijskim radom **6. lipnja 2016.**

Namira obračuna pozicija iz EuroNKS-a na eurskim računima banaka u TARGET2-HR provodit će se od **6. lipnja 2016.**

### **Prekogranične platne transakcije u eurima**

Obračun prekograničnih platnih transakcija SEPA kreditnog transfera u eurima posredovanjem platnog sustava EuroNKS započet će s produkcijskim radom **7. lipnja 2016.**

### **Kunske platne transakcije u SEPA formatu**

#### **SEPA kreditni transfer u kunama (HRK SCT u kunama)**

Infrastrukturno rješenje – mogućnost obračuna platnih transakcija kreditnih transfera u kunama zadanih prema SEPA shemi i u SEPA formatu izgrađeno je i spremno za testni rad.

Obračun platnih transakcija u kunama zadanih prema SEPA shemi i u SEPA formatu započeo bi s produkcijskim radom **6. lipnja 2016.**

#### **SEPA izravno terećenje u kunama (HRK SDD u kunama)**

Infrastrukturno rješenje – mogućnost obračuna platnih transakcija izravnog terećenja u kunama, koje bi u skladu s dogovorom bile zadane prema SEPA shemi i u SEPA formatu – bilo bi izgrađeno i spremno za testni rad **1. listopada 2016.**

Obračun platnih transakcija u kunama zadanih prema SEPA shemi i u SEPA formatu započeo bi s produkcijskim radom **1. veljače 2017.**

### **XML za korisnike**

Korisnici platnih usluga koji zadaju niz platnih transakcija putem datoteka ("paketa") u skladu s člankom 5. stavkom 1. pod d) Uredbe (EU) br. 260/2012 – "veliki korisnici" trebaju se osposobiti kako bi inicirali **kreditne transfere u eurima** prema SEPA formatu od **6. lipnja 2016.**

Veliki korisnici trebaju se osposobiti kako bi inicirali **kreditne transfere u kunama** prema SEPA formatu od **6. lipnja 2016.**, a **izravna terećenja u kunama** od **1. veljače 2017.**



# Schema plana migracije

